

CAIXA



Papel da CAIXA nos Projetos do FEP

JUNHO/2018

SUMÁRIO DA **apresentação**




1. GERENCIAMENTO DE PROJETOS

2. VERIFICADOR INDEPENDENTE

3. CONCLUSÃO

TRÍPLICE RESTRICÇÃO

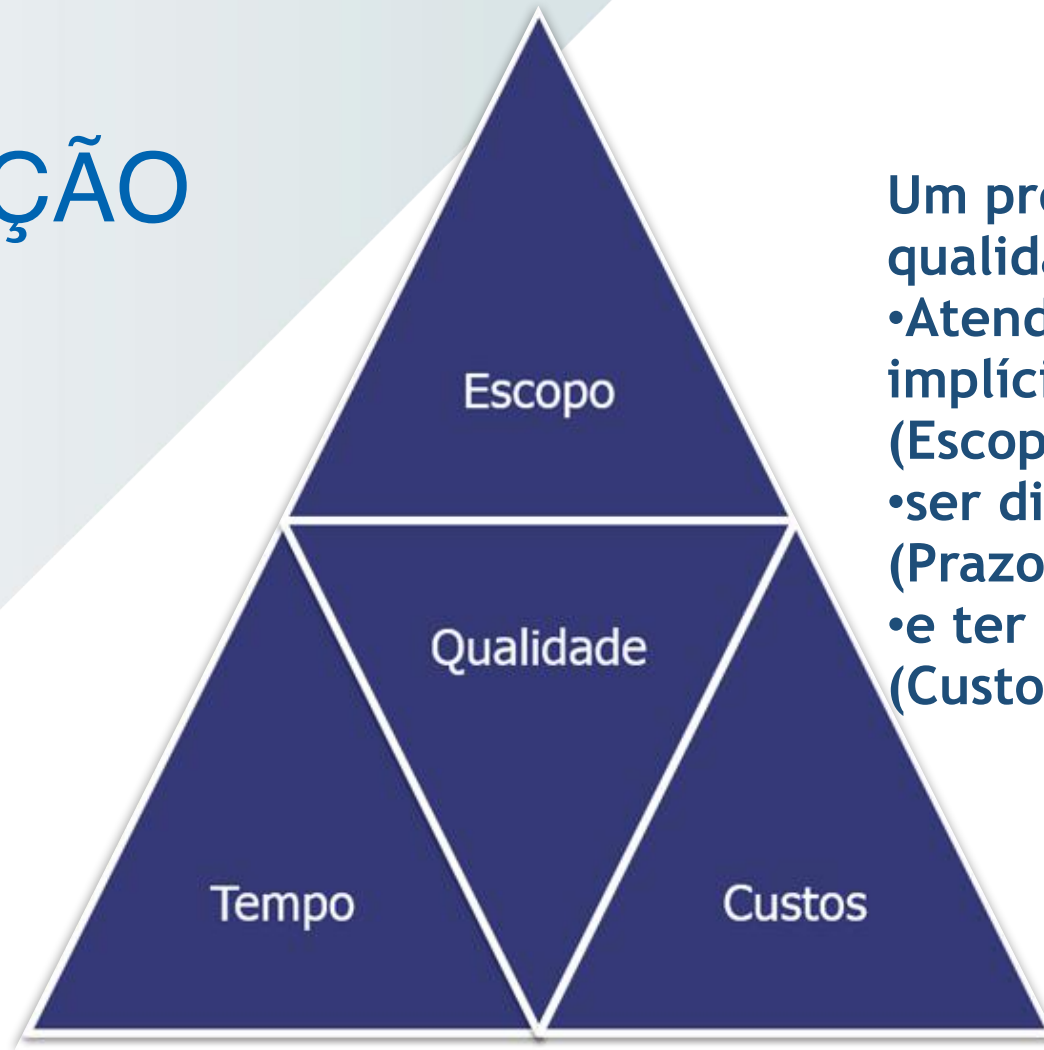

Um produto ou serviço de qualidade deveria:


- Atender as necessidades implícitas e explícitas do Cliente (Escopo);
- ser disponibilizado a tempo (Prazo);
- e ter preço e custos compatíveis (Custo).

- Para aumentar escopo, você precisa aumentar o custo e/ou o prazo;
- Para diminuir o prazo, você precisa aumentar o custo e/ou reduzir o escopo;
- Para diminuir o custo, você precisa reduzir o escopo.


ÁREAS DE CONHECIMENTO E GRUPOS DE PROCESSOS




ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS



Atuação alinhada com o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®).



Ferramenta base: MS PROJECT



Mapeamento das atividades




EAP
ESTRUTURA ANALÍTICA DE
PROJETOS

MS Project-cronograma

i	EDT	Nome da tarefa	Duração	Início	Maio/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18														
					22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02
	1.2.2	Verificar suficiência da documentação para início da FASE 1 (CAIXA)	1 dia	Seg 23/04/18																				
	1.3	FASE 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	262 dias	Ter 12/06/18																				
	1.3.1	Contratação da Consultoria	68 dias	Ter 19/06/18																				
	1.3.1.1	Analisar possibilidade de aproveitar lista, caso contrário: Promover Diligências e Publicação 1a	10 dias	Ter 19/06/18																				
	1.3.1.2	Realizar Publicação de Licitação	22 dias	Ter 03/07/18																				
	1.3.1.3	Realizar Certame	22 dias	Qui 02/08/18																				
	1.3.1.4	Analisar Documentações	22 dias	Seg 13/08/18																				
	1.3.1.5	Verificar Garantias e Convocação p Assinatura	22 dias	Qua 22/08/18																				
	1.3.1.6	Emitir Ordem de serviço de início dos serviços (CONSULTORIA)	0 dias	Qui 20/09/18																				
	1.3.2	Partida de Projeto	4 dias	Ter 12/06/18																				
	1.3.2.1	Preparar material para reunião de partida na pref	4 dias	Ter 12/06/18																				
	1.3.2.2	Reunião de partida	1 dia	Sex 15/06/18																				
	1.3.3	Desenvolvimento de Modelo RSU	34 dias	Qui 28/06/18																				
	1.3.3.1	Reunião com GIGOV local para alinhamento do p	1 dia	Qui 28/06/18																				
	1.3.3.2	Apresentação pela GIGOV local do Projeto Conc	8 dias	Sex 29/06/18																				
	1.3.3.3	Estimativas de ordem de grandeza de valores de	18 dias	Sex 29/06/18																				
	1.3.3.4	Modelagem do Projeto	33 dias	Sex 29/06/18																				
	1.3.4	Relatório Técnico da Análise Preliminar	63 dias	Sex 21/09/18																				
	1.3.4.1	Elaborar Relatório (CONSULTORIA)	40 dias	Sex 21/09/18																				
	1.3.4.1.1	Identificação e levantamento detalhado do objeto da P	40 dias	Sex 21/09/18																				
	1.3.4.1.2	Levantamento preliminar de ativos	40 dias	Sex 21/09/18																				
	1.3.4.1.3	Levantamento preliminar de passivos	40 dias	Sex 21/09/18																				
	1.3.4.1.4	Estrutura preliminar da matriz de riscos	40 dias	Sex 21/09/18																				
	1.3.4.1.5	Estimativa de CAPEX/OPEX	40 dias	Sex 21/09/18																				
	1.3.4.1.6	Estimativa de receita	40 dias	Sex 21/09/18																				




Porquê dos Projetos-Piloto?



Proximos passos

EIXO TÉCNICO
Desenvolvimento do
projeto conceitual




**EIXO COMUNICAÇÃO/
SOCIAL**

- Transparência
- Market Sounding & Road Show



Proximos passos

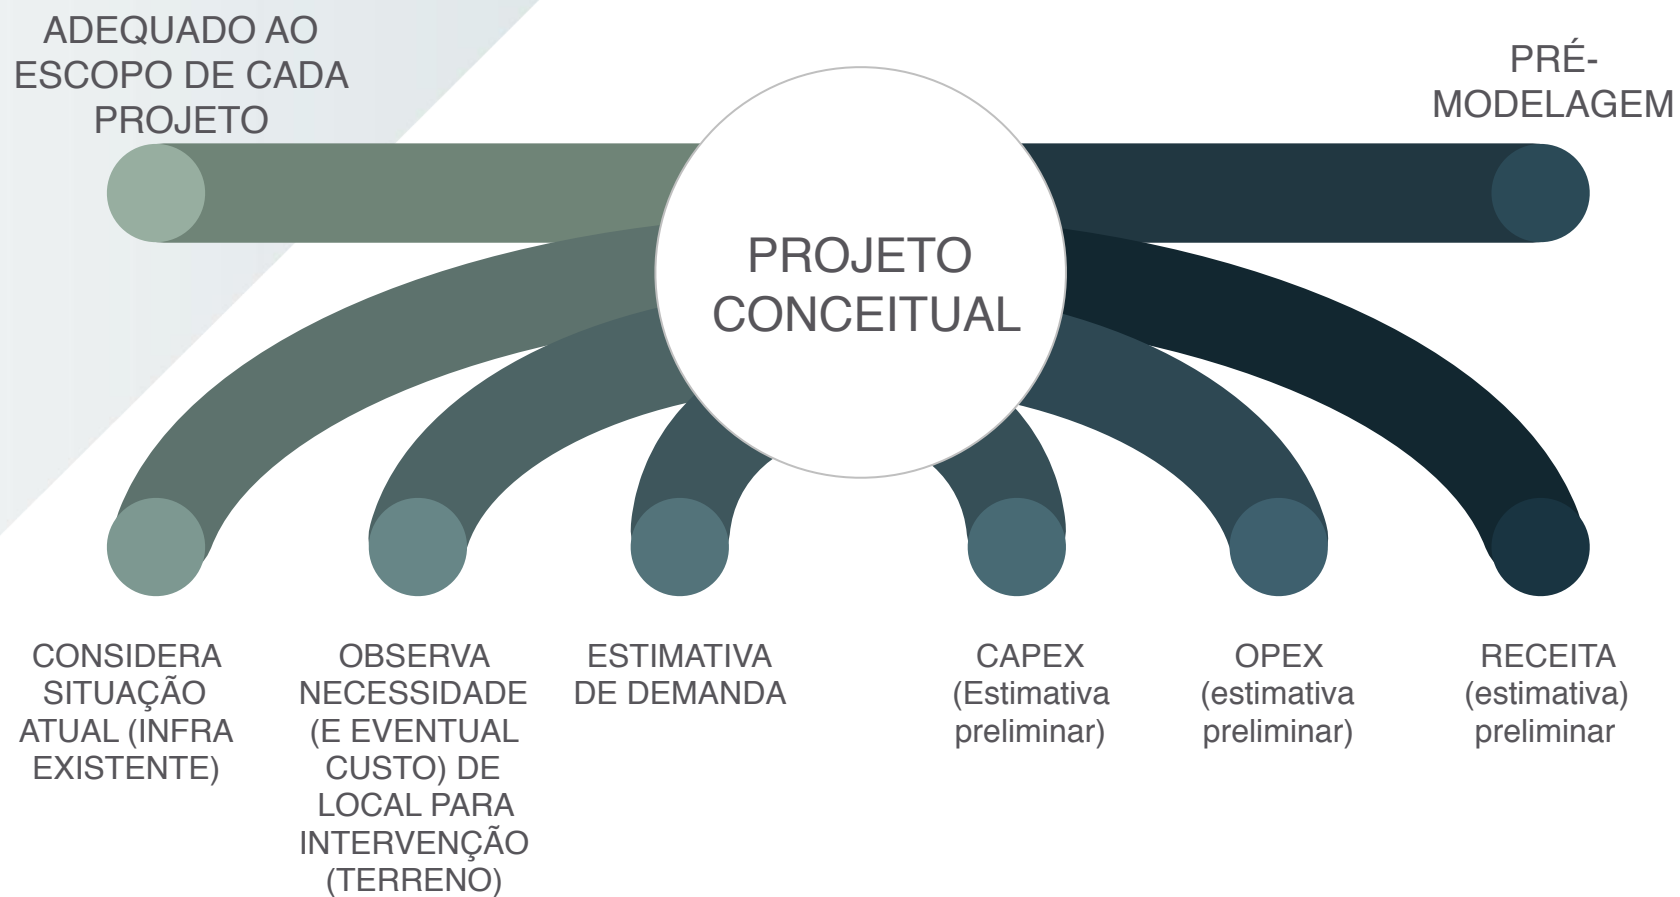


Proximos passos – COMUNICAÇÃO SOCIAL



PAPEL DO VERIFICADOR INDEPENDENTE EM PPP E CONCESSÕES

- organização que atua como parceira isenta;
- papel de avaliar o desempenho da contratada por meio de indicadores pré-estabelecidos
- dentre várias outras atribuições, atestar a qualidade dos serviços e se os mesmos estão em concordância com o que foi contratado.
- deve ser exercido por um *honest broker*, um *stakeholder* isento que atua como eixo da hélice quádrupla que envolve, em suas pontas, governo, academia, iniciativa privada e sociedade.



PAPEL DA CAIXA



01



ADICIONAR
VALOR AOS
PROJETOS NO
TOCANTE A
QUALIDADE E
TAXAS DE
SUCESSO

+ QUALIDADE PROJETOS

02



PROMOVER A
MELHORIA DA
PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS
DE QUALIDADE
À SOCIEDADE

+ SOCIEDADE





OBRIGADO

ANDRÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO
Gerente Executivo
Andre.o.Araujo@caixa.gov.br
61 3206-8065
